


CADERNO DE OBRA


Piscina Esmeralda & Quiosque – Projeto Executivo

Emitido em 06/09/2026

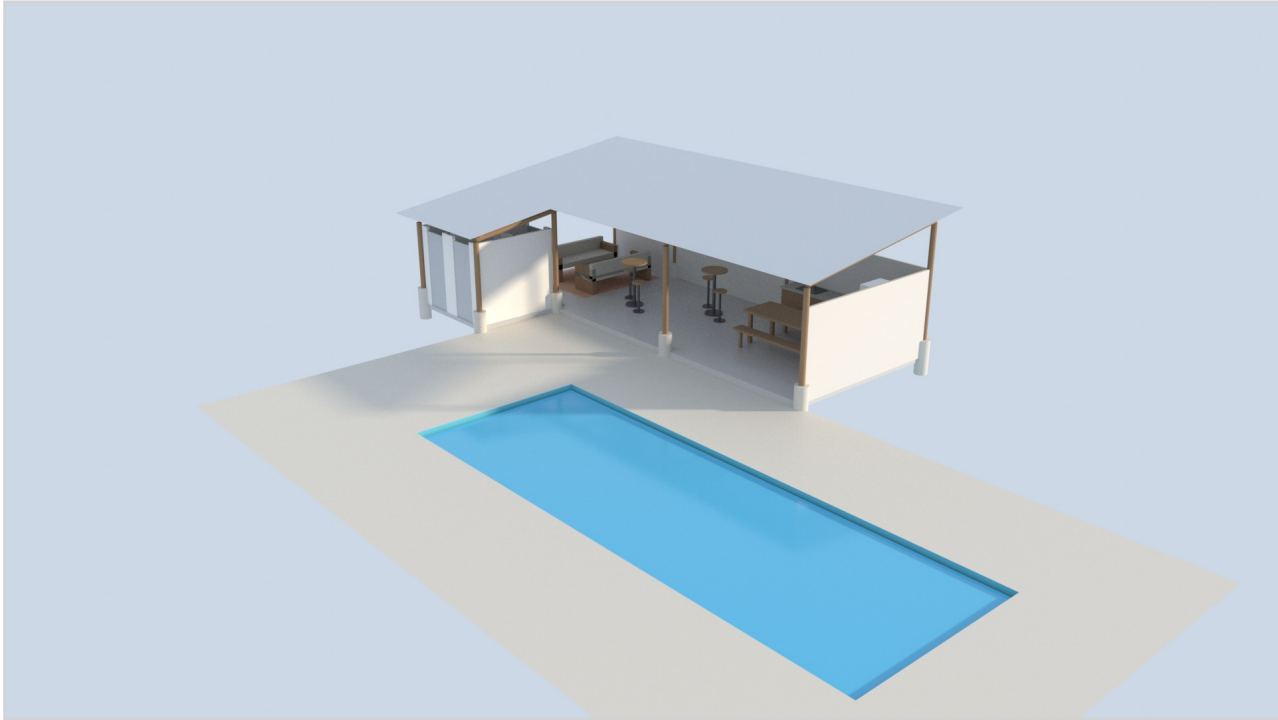


Conteúdo deste caderno

1. Vista geral do projeto (render 3D)
2. Planta técnica do quiosque – pilares e distâncias
3. Especificações técnicas gerais
4. Estrutura do telhado (meia-água em eucalipto)
5. Ambientes e mobiliário
6. Galeria de imagens adicionais
7. Sequência de execução recomendada

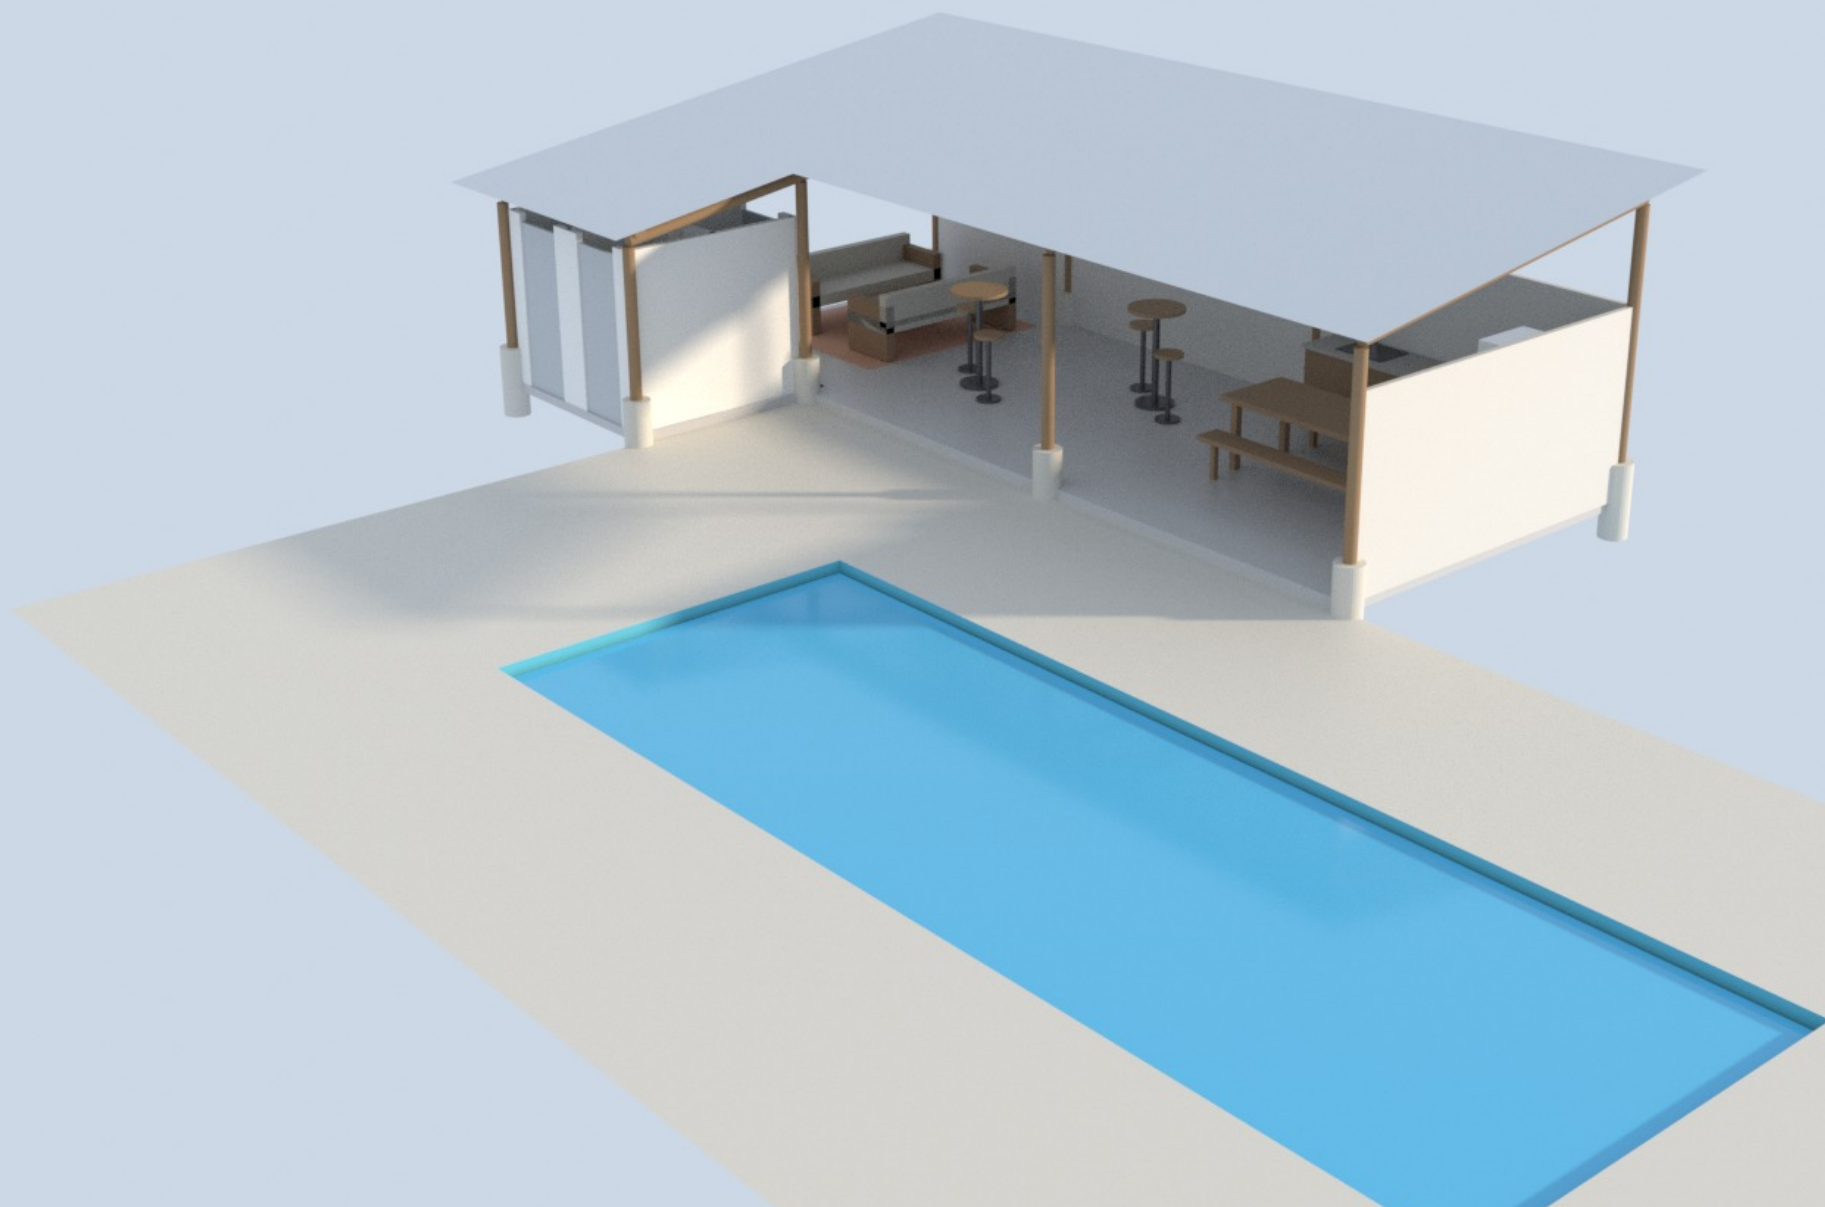

1. Planta Técnica do Quiosque

Nome, coordenadas e distâncias entre os 10 pilares de eucalipto.

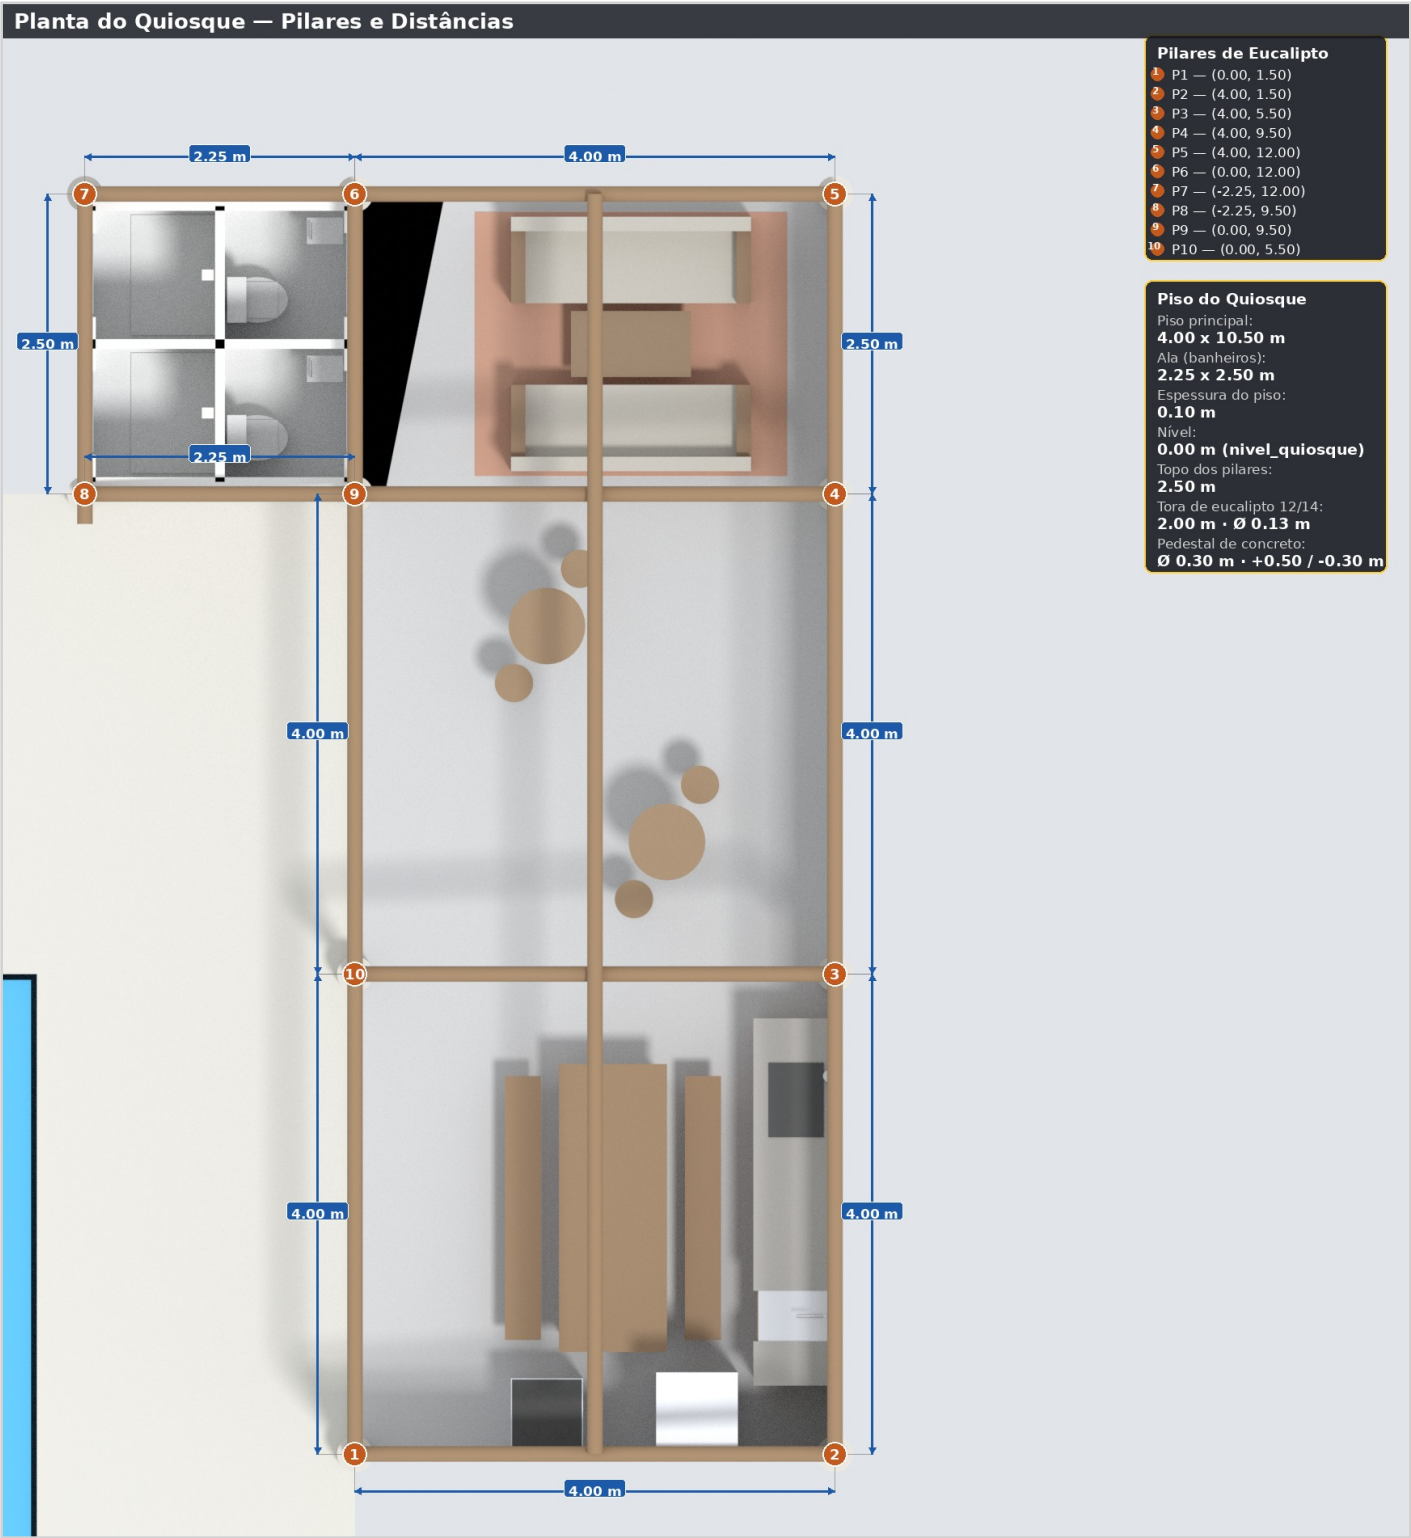

2. Especificações Técnicas Gerais

Piscina Esmeralda

Dimensões (largura x comprimento)	3.70 x 10.50 m
Profundidade	1.30 m (rasa) a 1.70 m (funda)
Volume aproximado	~54 m³
Posição do centro (x, y)	-4.5, 0.25
Nível da lâmina d'água	-0.10 m em relação ao piso

Piso do Quiosque

Piso principal	4.00 x 10.50 m
Ala (banheiros/gourmet)	~2.15 x 2.50 m
Espessura do piso	0.10 m
Piso de concreto (área externa)	9.00 x 16.50 m

Pilares de Eucalipto (10 unidades)

Classe / diâmetro	Eucalipto roliço 12/14 (Ø ~0.13 m)
Tora de madeira	2.00 m, apoiada no topo do pedestal
Pedestal de concreto	Ø 0.30 m, de -0.30 m a +0.50 m do piso
Topo dos pilares	2.50 m (pilares 7 e 8 da ala: ~2.16 m)
Alinhamento	Pilares 6 e 9 no eixo x=0 (junto a 1 e 10)

Parede de Fechamento

Material	Placa cimentícia
Trecho	Pilares 1-2-3-4-5 (lados sul e leste)
Altura	2.00 m (vão de ventilação até o beiral baixo)

3. Estrutura do Telhado

Telhado em meia-água, caimento de 15% escoando para oeste, em direção à piscina.

Caimento	
Sistema	Meia-água (uma só queda)
Inclinação	15% (~8,5°)
Sentido do escoamento	Para oeste (x = 0) - em direção à piscina
Lado alto	Leste (x = 4)
Desnível no vão de 4,0 m	0.60 m
Telhas e estrutura	
Telha	Metálica 1,00 x 4,50 m - vão livre máx. 2,50 m
Montantes	4 un., sobre a fileira leste (x=4), ~0.60 m
Vigas transversais	Eucalipto 12/14, sentido X, sobre pares de pilares
Terças	Eucalipto 12/14, sentido Y, em x = 0 / 2 / 4 (+ ala x = -2.25)
Beiral	0.40 m nas bordas externas
Alturas de referência (a partir do piso)	
Topo dos pilares (corpo principal)	2.50 m
Topo dos pilares 7 e 8 (ala)	~2.16 m (acompanham o caimento)
Vão livre sob o telhado	~2.6 m (oeste) a ~3.4 m (leste)
Beiral baixo (oeste, piscina)	~2.4 m

4. Ambientes e Mobiliário

Banheiros (ala, pilares 6-7-8-9)

Duchas quentes	2, lado oeste (porta para o lado da piscina)
Lavabos	2, lado leste (porta para o corredor do quiosque)
Corredor interno	Removido - cabines ampliadas

Área Gourmet (pilares 1-2-3)



Bancada	Pia + churrasqueira de bancada, acabamento rústico
Geladeira e fogão	Parede sul, entre pilares 1-2
Mesa	8 lugares, com bancos corridos

Sala de Estar (pilares 4-5-6)

Mobiliário	2 sofás + mesa de centro + tapete
TV	Parede leste, entre pilares 4-5


Mesas de Bar (pilares 3-4)

Quantidade	2 mesas altas, 2 banquetas cada
------------	---------------------------------

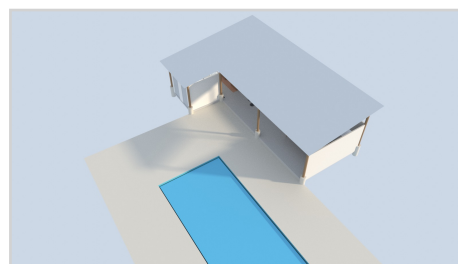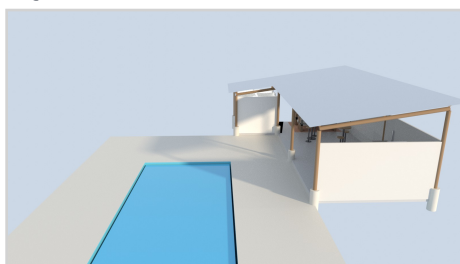


5. Galeria de Imagens Adicionais


Área da Pia / Bancada Gourmet

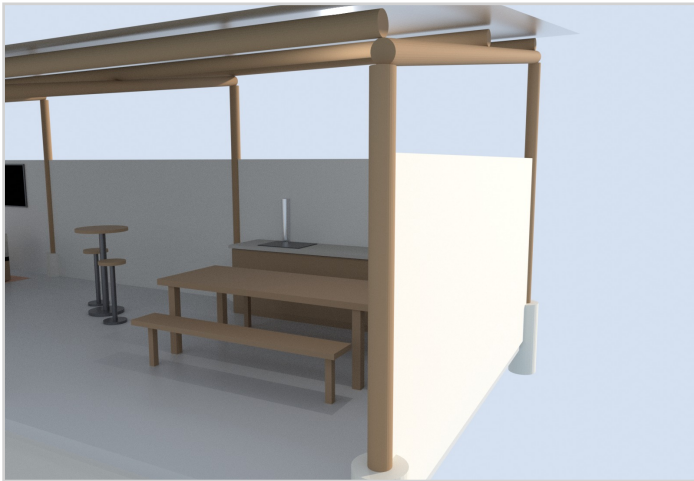


Corredor Olhando para a Cozinha

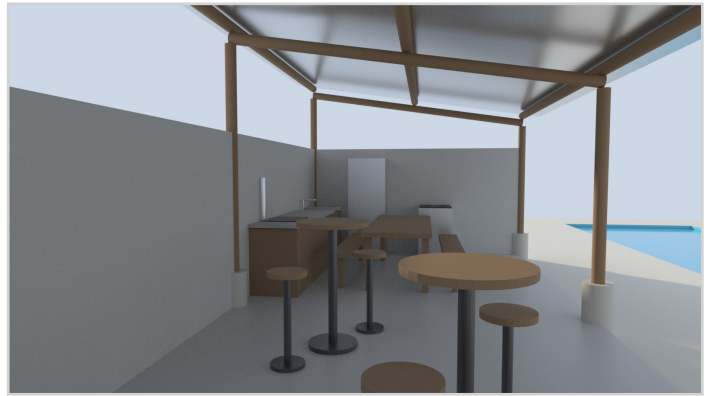


Interior da Ducha

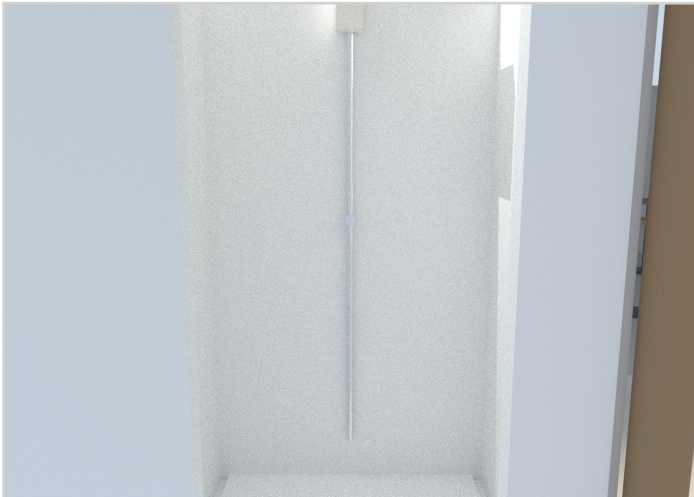


Interior do Lavabo

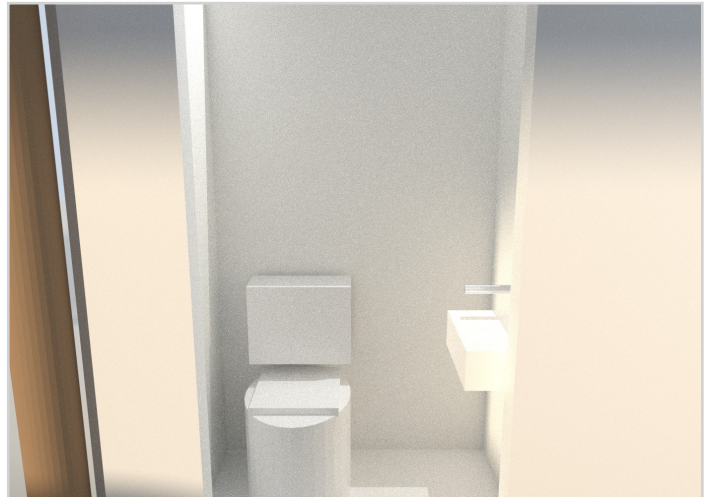

Planta dos Banheiros

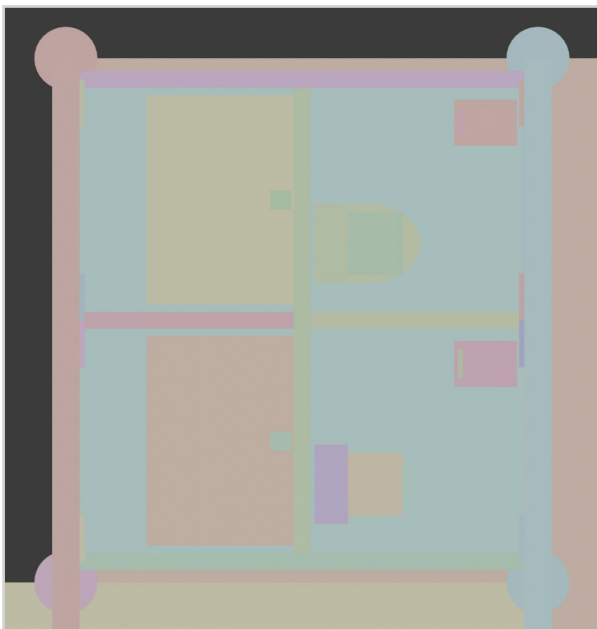

Vista 360° (Fisheye)

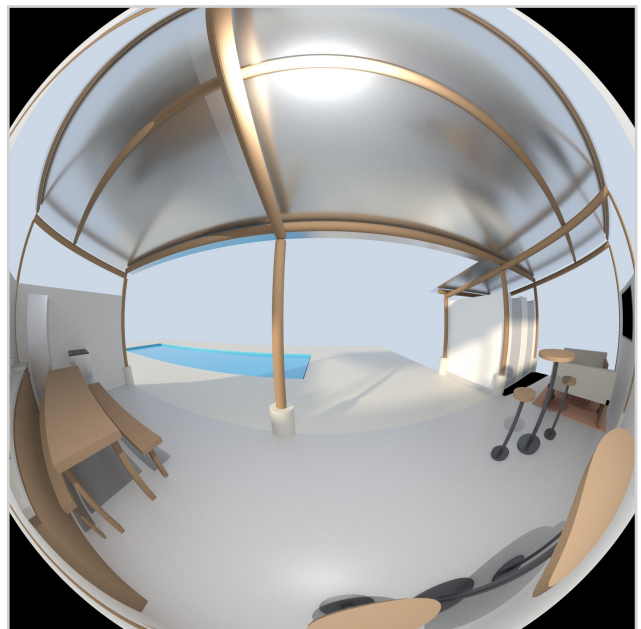

6. Sequência de Execução Recomendada

01. Escavação e execução da casca/impermeabilização da piscina esmeralda.
02. Execução do piso de concreto da área externa e piso do quiosque (principal + ala).
03. Execução das brocas e pedestais de concreto ($\varnothing$ 0.30 m, de -0.30 a +0.50 m) nas 10 posições da planta.
04. Montagem dos 10 pilares de eucalipto 12/14 (tora de 2.00 m) sobre bases metálicas fixadas nos pedestais.
05. Montagem dos montantes (leste) e das vigas transversais 12/14, formando o caimento de 15% para oeste.
06. Montagem das terças 12/14 ($x = 0 / 2 / 4$ + ala) e assentamento das telhas 1,00 x 4,50 m (vão livre $\leq 2,5$ m).
07. Levantamento da parede de fechamento em placa cimentícia (pilares 1-2-3-4-5).
08. Construção das paredes e instalação hidráulica dos banheiros (ala, pilares 6-7-8-9).
09. Instalação da bancada, pia, churrasqueira, geladeira e fogão (área gourmet, pilares 1-2-3).
10. Instalação da lâmina d'água e acabamento (azulejo) da piscina.
11. Montagem do mobiliário: mesa de 8 lugares, mesas de bar, sala de estar e TV.
12. Limpeza geral e vistoria final.

Observação:

Este caderno reflete o projeto 3D gerado até o momento da emissão. Medidas devem ser conferidas em campo antes da execução. Consultar responsável técnico para dimensionamento estrutural definitivo das vigas e fundações dos pilares.
